


Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcen
1	Entwurfsplanung	157 Tage	Die 01.01.19	Fre 09.08.19	di
2	Entwurfsplanung	117 Tage	Die 01.01.19	Fre 14.06.19	di
3	Einbindung Fachplaner (TGA/ Statik/ Brandschutz)	10 Tage	Sam 02.03.19	Fre 15.03.19	di
4	Vorlage und Abstimmung Konzept Fassadengestaltung	5 Tage	Mon 01.04.19	Fre 05.04.19	di/ Wobag
5	Abstimmung Höhenpunkte Außenanlagen	3 Tage	Mit 03.04.19	Fre 05.04.19	di/ FLA
6	Abstimmung Fassadengestaltung mit Stadtverwaltung	20 Tage	Mon 08.04.19	Die 07.05.19	di/ Wobag
7	Entwurfsplanung TGA	38 Tage	Mit 01.05.19	Fre 21.06.19	Bühler, Burgert
8	Schall-/ Wärmeschutz	23 Tage	Mon 13.05.19	Mit 12.06.19	Stahl+Weiß
9	Statik	70 Tage	Mit 01.05.19	Die 06.08.19	Kienzler
10	Freigabe Entwurfsplanung	0 Tage	Fre 14.06.19	Fre 14.06.19	Wobag
11	Freiflächenplanung	40 Tage	Mon 17.06.19	Fre 09.08.19	
12	Erstellung Kostenberechnung	20 Tage	Mon 17.06.19	Fre 12.07.19	Moser
13	Vorlage Kostenberechnung	0 Tage	Fre 12.07.19	Fre 12.07.19	Moser
14					
15	Genehmigungsplanung	153 Tage	Mon 18.03.19	Fre 18.10.19	
16	Bauantragsplanung Baugrube	9 Tage	Mon 18.03.19	Fre 29.03.19	di
17	Einreichen Bauantrag Baugrube/ Wasserhaltung	0 Tage	Fre 29.03.19	Fre 29.03.19	Wobag
18	Genehmigungsfrist Bauantrag Baugruben	73 Tage	Mon 01.04.19	Fre 12.07.19	LRA
19	Klärung Pachverhältnis mit Nachbar Bliesterer	15 Tage	Don 18.04.19	Fre 10.05.19	Wobag/ Stadt Bad Krozingen
20	Bauantragsplanung Gebäude	10 Tage	Mon 17.06.19	Fre 28.06.19	di
21	Einreichen Bauantrag Gebäude	0 Tage	Fre 28.06.19	Fre 28.06.19	Wobag
22	Genehmigungsfrist Bauantrag Gebäude	80 Tage	Mon 01.07.19	Fre 18.10.19	LRA
23	Entwässerungsgesuch	15 Tage	Mon 10.06.19	Fre 28.06.19	Bühler
24	Einreichen Entwässerungsgesuch	0 Tage	Fre 28.06.19	Fre 28.06.19	Bühler
25	Prüfstatik	40 Tage	Mit 07.08.19	Die 01.10.19	
26					
27	Ausführungsplanung	110 Tage	Mon 01.07.19	Fre 29.11.19	
28	Ausführungsplanung	110 Tage	Mon 01.07.19	Fre 29.11.19	di
29					
30	Ausschreibung/ Vergabe	200 Tage	Mon 03.06.19	Fre 06.03.20	
31	Vergabe Verbaubarbeiten	10 Tage	Mon 03.06.19	Fre 14.06.19	Moser
32	Vergabe Erdarbeiten/ Rohbau	30 Tage	Mon 17.06.19	Fre 26.07.19	Moser
33	Vergabe Gebäudehülle	70 Tage	Mon 29.07.19	Fre 01.11.19	Moser
34	Vergabe Ausbau	90 Tage	Mon 04.11.19	Fre 06.03.20	Moser
35					
36	Bauausführung	610 Tage	Mon 29.04.19	Fre 27.08.21	
37	Beweissicherung Bestandsgebäude	5 Tage	Mon 24.06.19	Mon 01.07.19	Wobag
38	Umliegungen Versorgungsleitungen/ Freimachen Baugrundstück	50 Tage	Mon 29.04.19	Fre 05.07.19	Stadt Bad Krozingen
39	Vollsperrung	0 Tage	Mon 01.07.19	Mon 01.07.19	
40	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 01.07.19	Fre 12.07.19	Moser
41	Vorbereitung Verbaubarbeiten	9 Tage	Mon 01.07.19	Fre 12.07.19	Moser
42	Verbaubarbeiten	10 Tage	Mon 15.07.19	Fre 26.07.19	Moser
43	Grabungsarbeiten gesamtes Baufeld (bis auf Wasserebene)	30 Tage	Mon 29.07.19	Fre 06.09.19	Moser/ Archbau
44	Spatenstich	0 Tage	Fre 06.09.19	Fre 06.09.19	
45	Grabungsarbeiten (Baufeld A/B)	30 Tage	Mon 19.08.19	Fre 27.09.19	Moser/ Archbau
46	Rohbau A/B inkl. Verfüllung Baugrube	90 Tage	Mon 16.09.19	Fre 17.01.20	Moser
47	Grabungsarbeiten (Baufeld E)	35 Tage	Mon 06.01.20	Fre 21.02.20	Moser/ Archbau
48	Rohbau E inkl. Verfüllung Baugrube	80 Tage	Mon 24.02.20	Fre 12.06.20	Moser
49	Grabungsarbeiten (Baufeld D)	35 Tage	Mon 15.06.20	Fre 31.07.20	Moser/ Archbau
50	Rohbau D inkl. Verfüllung Baugrube	80 Tage	Mon 03.08.20	Fre 20.11.20	Moser
51	Fassade A/B	100 Tage	Mon 20.01.20	Fre 05.06.20	Moser
52	Fassade E	80 Tage	Mon 15.06.20	Fre 02.10.20	Moser
53	Fassade D	80 Tage	Mon 23.11.20	Fre 12.03.21	Moser
54	Ausbau A/B, D, E	350 Tage	Mon 30.03.20	Fre 30.07.21	Moser
55	Außenanlagen	235 Tage	Mon 08.06.20	Fre 30.04.21	Stadt Bad Krozingen
56	Fertigstellung	0 Tage	Fre 30.07.21	Fre 30.07.21	Moser
57	Abnahmen, Inbetriebnahmen	30 Tage	Mon 19.07.21	Fre 27.08.21	Moser
58	Übergabe an Bauherrn	0 Tage	Fre 27.08.21	Fre 27.08.21	Moser

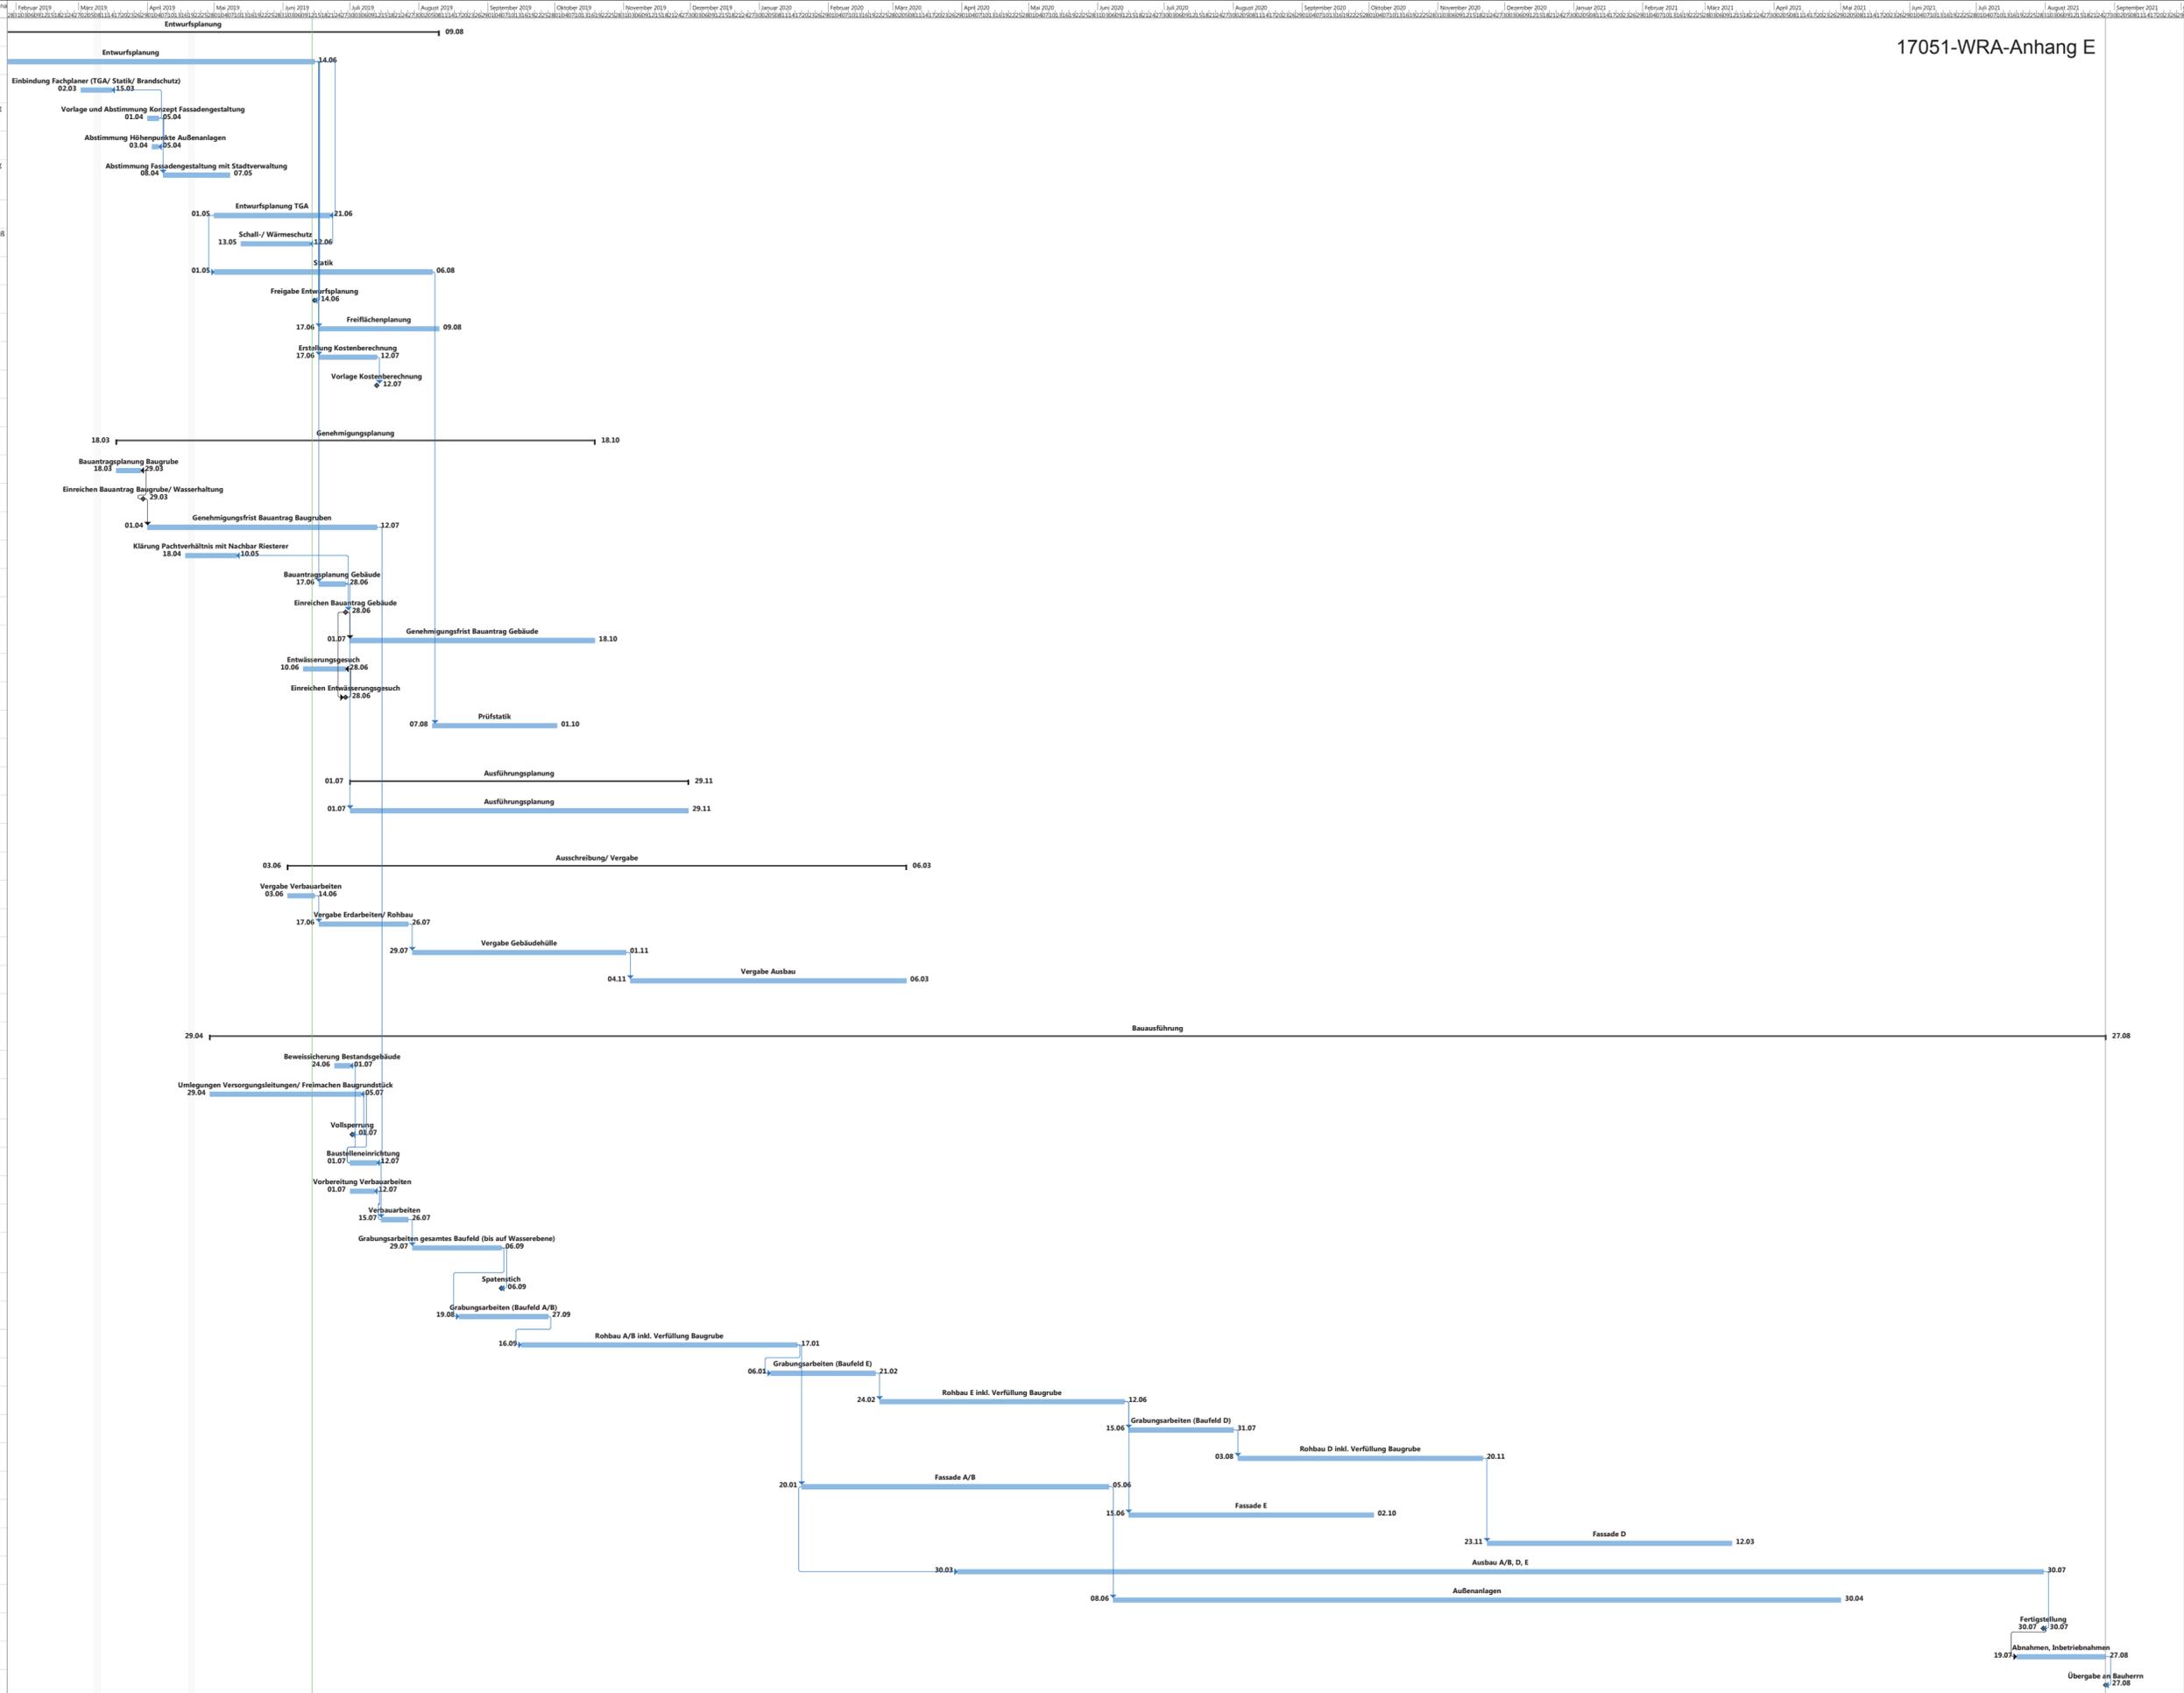

17051-WRA-Anhang E
